Umsetzung/Fertigstellung 2020:

- **Hohe Mark Steig - Infrastruktur** - Ausschilderung und Ausstattung eines 150 km langen, zertifizierbaren Fernwanderweges von Olfen bis Wesel
- **Naturverträgliche Tourismusentwicklung der Haard** mit den Bausteinen: Waldpromenade, Mountainbike-Route, Themen-Wanderrouten, Orientierungssystem
- **Stimberghöhe -** Naturschutz-Entwicklung auf dem Stimberg in der Haard mit umweltpädagogischen Elementen
- **Vom Verbot zum Angebot -** ein neuer Internet-Auftritt für den Naturpark Hohe Mark

In der Umsetzung bis 2021

- **Hohe Mark Steig - Marketing** - die touristische Vermarktung des Fernwanderweg von Olfen bis Wesel
- **Hohe Mark Radroute** - Weiterentwicklung und Qualifizierung des rund 300 km langen Rundkurses durch den Naturpark
- **Willkommen im WALDband** - Konzeptionierung und Ausstattung von Willkommensorten im Naturpark
- **WALDweideprojekt in der Üfter Mark** - Sicherung der Biodiversität durch ökonomisch und ökologisch nachhaltige Neophytenbekämpfung

Zuwendungsbescheid vorauss. im Februar 2020:

- **Spielplatz an der Waldpromenade Haard -** ein neues Spielangebot für Familien mit Kindern am Südrand der Haard

In der Konzeption:

- **Ehemaliges Munitionsdepot Hünxe** - Biodiversität durch Niederwaldbewirtschaftung und biotopverbessernde Maßnahmen sowie ein barrierefreier Naturerlebnisrundweg

Fertigstellungen und Eröffnungen in 2020

Den Auftakt für ein ereignisreiches WALDband-Jahr 2020 machte das Teilprojekt **Naturverträgliche Tourismusentwicklung der Haard:** Am 27. Januar erfolgte der Spatenstich für die Waldpromenade. Am 28. März folgt die Eröffnung der Mountainbike-Route mit einer Sternfahrt zum Dachsberg. Die Themen-Wanderrouten und die Waldpromenade werden voraussichtlich am 20. Juni mit einer festlichen Veranstaltung eingeweiht und für die Besucher*innen frei gegeben. Das neue Orientierungssystem führt den Gast zu den Angeboten und trägt zur gezielten Besucherlenkung bei. Der **Hohe Mark Steig** wird vom 05. bis 07.Juni mit Vertreter*innen der Bezirksregierungen, Kreise und Kommunen sowie unter Begleitung von Autor, Moderator und Wanderer Manuel Andrack feierlich eröffnet.
Das Teilprojekt **Stimberghöhe** - Naturschutzgebiet und grünes Klassenzimmer - soll im Laufe des zweiten Halbjahres 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt und für die Nutzung frei gegeben werden.
Mit dem neuen Internet-Auftritt **„Vom Verbot zum Angebot“** stellt der Naturpark Hohe Mark 2020 die wichtigste Informationsplattform zur Präsentation der WALDband-Teilprojekte und ihrer Implementierung in den Naturpark Hohe Mark zur Verfügung. Dazu erfolgen Meldungen auf Facebook, Instagram und an die Presse.

Ausblick

Basierend auf dem Beschluss der Verbandsversammlung von Juli 2018, die weitere Umsetzung von WALDband-Maßnahmen auf der Grundlage des Regionaltouristischen Konzepts für den Naturpark Hohe Mark zu verfolgen, erarbeitet der RVR gemeinsam mit dem Naturpark aktuell das Leitprodukt „Hohe Mark Erlebnisräume“. Dieses Leitprodukt wird - neben dem Hohe Mark Steig und der Hohe Mark Radroute - die drei Leitprodukte des Naturparks komplettieren. Hohe Mark Erlebnisräume sind räumlich-thematische Angebotskonzentrationen für einen mindestens eintägigen Aufenthalt in einem Teilraum des Naturparks. Insgesamt sind acht Erlebnisräume geplant - ein Pilotraum ist die Kirchheller Heide, für die aktuell ein Konzept mit Maßnahmenkatalog erstellt wird.
Mit dem Projekt WALDband gelingt es, dem Naturpark einen wichtigen Entwicklungsimpuls zu geben und ihn als bedeutenden Standortfaktor für die Metropole Ruhr nachhaltig zu stärken.

Ansprechpartner
Regionalverband Ruhr
Referat Regionalentwicklung
Martin Wirtz
Kronprinzenstraße 35
45128 Essen
0201 2069-650
wirtz@rvr.ruhr
www.rvr.ruhr
www.naturpark-hohe-mark.de/de/was-ist-das-waldband/

www.WALDband.de

WALDband
3. Statusbericht
Februar 2020

REGIONALVERBAND RUHR
100 JAHRE ZUKUNFT

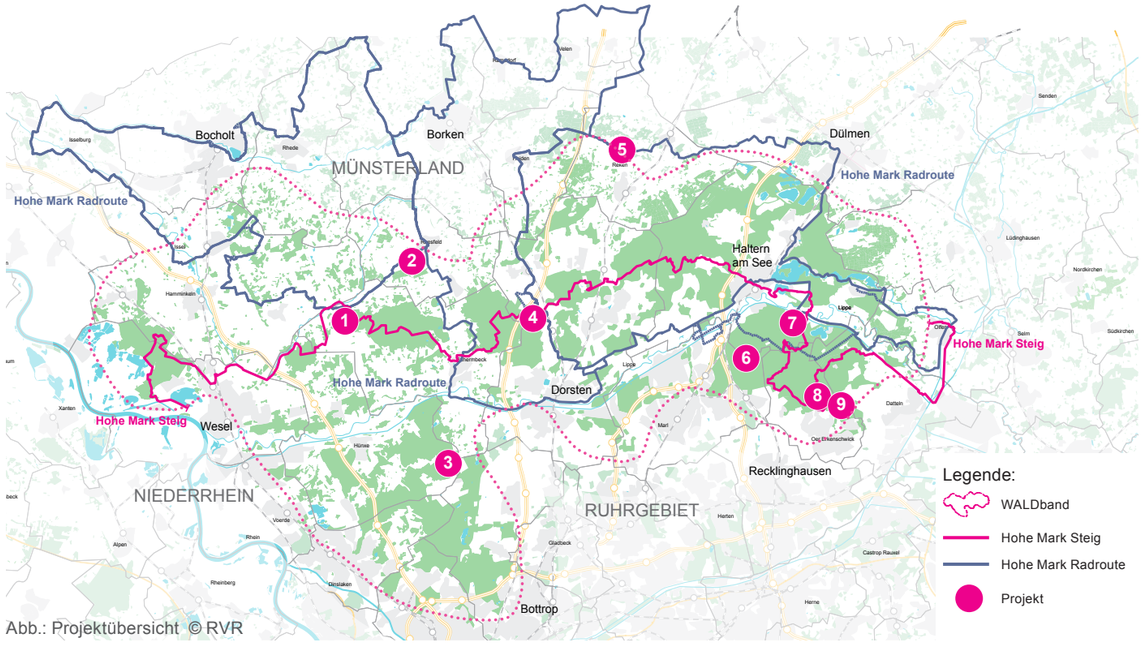

Abb.: Projektübersicht © RVR

Das Projekt WALDband ist aus der Regionale 2016 ZukunftsLAND hervorgegangen und ein Impulsprojekt für den Naturpark Hohe Mark. Es befindet sich derzeit in der Hochphase seiner Umsetzung:
Nachdem bereits 6 von 16 Teilprojekten fertig gestellt werden konnten, befinden sich aktuell weitere 8 Teilprojekte mit einer Gesamtsumme von 4,5 Mio. € in der Realisierung - 4 davon werden in 2020 abgeschlossen und die geschaffenen Infrastrukturen und Angebote eröffnet.

Der Projekt-Raum im Übergang von Metropole Ruhr, Münsterland und Niederrhein verfügt über große zusammenhängende Waldflächen und stellt damit einen besonderen Wert und ein besonderes Potenzial dar. Auf den Waldflächen und ihren Zwischenräumen lastet ein hoher Nutzungsdruck zahlreicher konkurrierender Interessen. Um modellhafte Antworten auf die Zukunftsfragen dieses Raumes zu finden, arbeiten als gemeinsame Projektträger der Regionalverband Ruhr, der Landesbetrieb Wald und Holz NRW und der Naturpark Hohe Mark Westmünsterland zusammen. Das Projektgebiet umfasst große Teile des Naturpark Hohe Mark mit den RVR-Mitgliedskommunen Bottrop, Datteln, Dinslaken, Dorsten, Haltern am See, Hamminkeln, Hünxe, Marl, Oer-Erkenschwick, Schermbeck und Wesel.

Die Ziele des Projektes WALDband entsprechen den Zielsetzungen der RVR-Strategie in den Strategiefeldern Tourismus und Freizeit sowie Ökologie.

Sachstand Teilprojekte
Von den insgesamt 16 Teilprojekten wurden bzw. werden 11 Teilprojekte mit EU- und/oder Landesmitteln gefördert - für zwei weitere wird eine Förderung erwartet bzw. angestrebt. Damit konnten bisher Fördermittel in Höhe von 4,1 Mio. € akquiriert werden, weitere 280.000 € stehen in Aussicht.

Bis 2018 fertig gestellt:

- **WALDgesichter** - Raumanalyse und Pespektiven unter dem Titel „Rasterfahndung“ in Zusammenarbeit mit der Hochschule Ostwestfalen-Lippe sowie öffentlicher Fotowettbewerb
- **WALDerlebnisweg Reken** - Wanderweg mit 12 Erlebnissstationen zum Thema „Leben von Tieren und Pflanzen im Wald“
- **Inklusion in der Landschaft** - ein barrierearmer Rundweg im Tiergarten Raesfeld
- **Biene trifft Wildschwein** - Biodiversitätsprojekt auf RVR-eigenen Flächen in der Haard
- **Regionaltouristisches Konzept** für den Naturpark Hohe Mark zur touristischen Neuausrichtung und Vermarktung des Naturparks
- **Neue Wildnis Dämmerwald in Schermbeck** - Rundweg mit Informationen zur Erkundung eines entstehenden Wildnisgebietes

Statusbericht Februar 2020

www.WALDband.de

WALDband Teilprojekte

Teilprojekt mit A-Status der Regionale 2016	Thema	Träger	Aktueller Stand 01.2020 (Änderungen gegenüber 2019)	Kostenschätzung Dossier / EFRE – Projektbeschreibung 2015	Förderung / Finanzierung	Förderfähige Projektsumme 2016	Differenz in €	Nummerierung im Übersichtsplan
Waldgesichter	Raumanalyse/ Raumidentität Ausstellung	RVR	Abgeschlossen 2017	80.000	Eigenmittel RVR	10.000	-70.000	Gesamtraum
Walderlebnisweg Reken	Umweltbildung	Gemeinde Reken	Fertig gestellt 2016	30.000	LEADER	30.000	0	5
Inklusion in der Landschaft	Inklusion	Akademie des Handwerks Raesfeld	Fertig gestellt 2017	470.000	NRW.vital	240.000	-230.000	2
Biene trifft Wildschwein	Biodiversität	RVR	Fertig gestellt 2017	70.000	Eigenmittel RVR RuhrGrün	39.000	-31.000	7
Regionaltouristisches Konzept	Regionaltourismus	RVR	Fertig gestellt 2018	231.000	EFRE	173.000	-58.000	Gesamtraum
Neue Wildnis Dämmerwald	Umweltbildung	Gemeinde Schermbeck mit W+H	Fertig gestellt 2018	127.000	LEADER	380.000	+253.000	1
Hohe Mark Steig - Infrastruktur	Regionaltourismus	RVR	In Umsetzung seit 2017	832.000	EFRE	1.263.000	+431.000	Gesamtraum
Die Haard – Naturverträgliche Tourismusentwicklung	Regionaltourismus	RVR	In Umsetzung seit 2017	1.756.000	EFRE	1.471.000	-285.000	6
Stimberghöhe	Biodiversität/ Umweltbildung	Kreis Recklinghausen	In Umsetzung seit 2017	Neues Teilprojekt (nach Dossier 2015)	FöNa	430.000	+430.000	8
Internetauftritt NPHM („Vom Verbot zum Angebot“)	Regionaltourismus	NPHM	In Umsetzung seit 2018	102.000	EFRE	103.000	+1.000	Gesamtraum
Hohe Mark Steig - Marketing	Regionaltourismus	NPHM	In Umsetzung seit 2018	346.000	EFRE	380.000	+34.000	Gesamtraum
Hohe Mark Radroute	Regionaltourismus	NPHM	In Umsetzung seit 2019	136.000	EFRE	544.000	+408.000	Gesamtraum
Willkommen im WALDband	Regionaltourismus	NPHM	In Umsetzung seit 2019	230.000	EFRE	200.000	-30.000	Gesamtraum
Waldweideprojekt in der Üfter Mark	Biodiversität	RVR	In der Umsetzung (ohne Förderung)	Neues Teilprojekt (nach Dossier 2015)	Eigenmittel RVR Ruhr Grün	Aktuelle Schätzung 100.000	+100.000	4
Spielplatz Waldpromenade in der Haard	Regionaltourismus	Stadt Oer-Erkenschwick	Zuwendungsbescheid voraussichtlich 02.2020	108.000 (Verbundprojekt Waldpromenade)	EFRE	218.000	+110.000	9
Ehemaliges Munitionsdepot Hünxe	Biodiversität	RVR	In der Konzeption (Förderantrag für Planung gestellt)	Neues Teilprojekt (nach Dossier 2015)	FöNa	Aktuelle Schätzung 150.000	+150.000	3
ELA-Sturm-Erlebnis Wald	Umweltbildung	Stadt Recklinghausen	Vom Träger zurück gestellt	114.000	./.	0	-114.000	./.
Dingdener Heide	Regional-Tourismus	Stiftung Dingdener Heide	Integration in Hohe Mark Radroute	487.000	./.	0	-487.000	./.
Jugend-Erlaubnis Wald	Umweltbildung	LWL Haard-Klinik	Wird vom Träger nicht weiterverfolgt	84.000	./.	0	-84.000	./.
Summe				**5.203.000**		**5.731.000**	**+528.000**	
